

- 1.费用目标对业主而言是投资目标,对施工方而言是成本目标。
- 2.按照工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分,项目管理的类型有:业主方的、施工方的、设计方 承包方的、供货方的、工程总承包方的项目管理。
- 3.对建设工程项目施工负有全面管理责任的是项目经理。
- 4.建设工程监理的工作性质的特点有:服务性、科学性、独立性和公平性。
- 5.旁站监理是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督和活动。
- 6.根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同,可分为:施工组织总设计、单位工程 施工组织设计、分部(分项)工程施工组织设计。
- 7.成本管理的任务包括:成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。
- 8.施工进度计划的编制方法包含:横道图、单代号网络图、双代号网络图和双代号时标网络图。
- 9.在网络计划图中,关键路线是总的工作持续时间最长的线路。
- 10.控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。其中组织措施是最重要的措施。
- 11.施工项目一旦发生安全事故,必须实施“四不放过”的原则,包括:事故原因未查清不放过、事故损失未挽回不放过、责任人员未受到处理不放过、有关人员没有受到教育不放过。
- 12.建设工程参建各方中具有投资目标的项目管理包括:业主方、设计方、项目总承包方的项目管理。

11、施工方项目管理的任务包含“三管三控一协调”具体是指什么?

答案:安全管理、合同管理、信息管理、成本控制、质量控制、进度控制、组织与协调

12.施工方项目管理的任务是什么?

答案:安全管理、合同管理、信息管理、成本控制、质量控制、进度控制、组织与协调

13、请列出参与工程建设的各方。

14、安全事故的四不放过原则

17.请按照时间顺序列出工程的基本建设程序。

答案:项目建议书阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、生产动用前准备阶段、竣工验收、保修阶段

18.建设工程项目管理的内涵是指什么

答案:自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。

44.请写出成本控制的流程

答案:成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核

17、请写出质量事故处理的一般程序


答案:① 事故上报;② 组织事故调查;③ 分析事故产生原因;④ 编制事故处理技术方案;⑤ 实施事故处理;⑥ 处理结果检查验收;⑦ 编写并上报事故处理总结报告。

20、某工程施工工序包含五个工作,其时间和对应紧前工作如下表:

工作持续时间(天)	1	2	5	4	5	5	3
工作名称	A	B	C	D	E	F	G
紧前工作	——	A	——	AC	AC	BD	E

- (1)、请绘制本工程的双代号网络图。
- (2)、计算各工作的六时标。
- (3)、写出工期，并绘出关键线路。

答案:

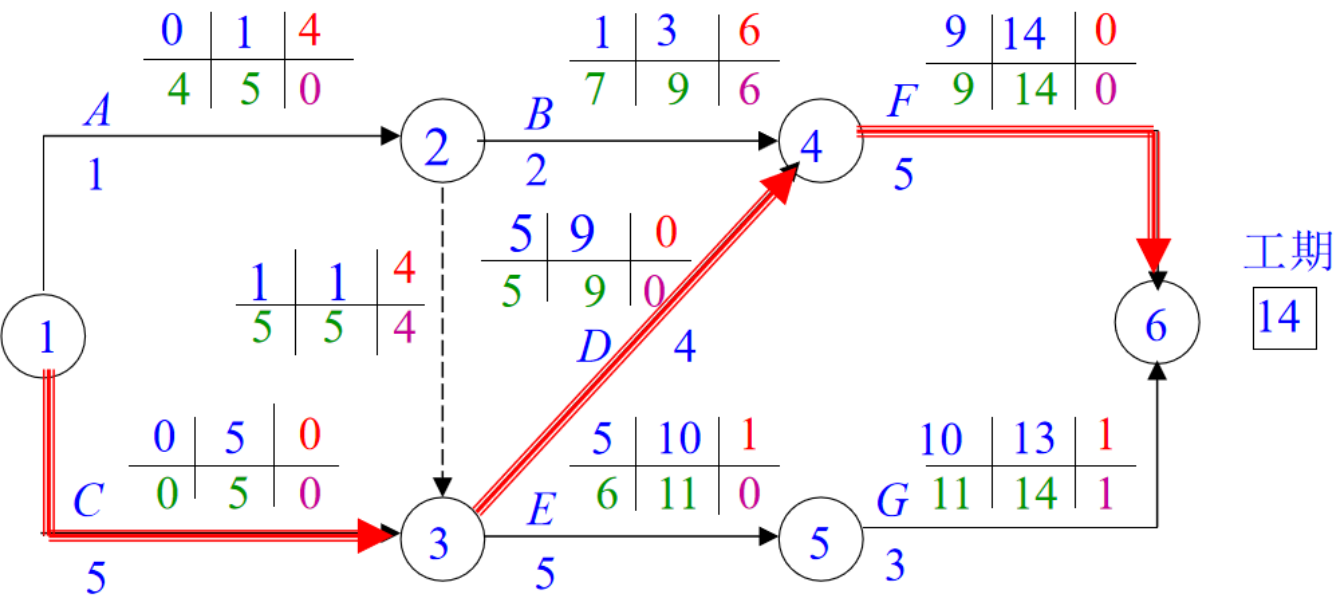

图例:

<i>ES</i>	<i>EF</i>	<i>TF</i>
<i>LS</i>	<i>LF</i>	<i>FF</i>
